

**Obiekt 01PZ i 02PZ**

Załącznik nr 22


Stan na 31.05.2016 r.

**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku


**Obiekt 01-PZ km 449+185,54**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

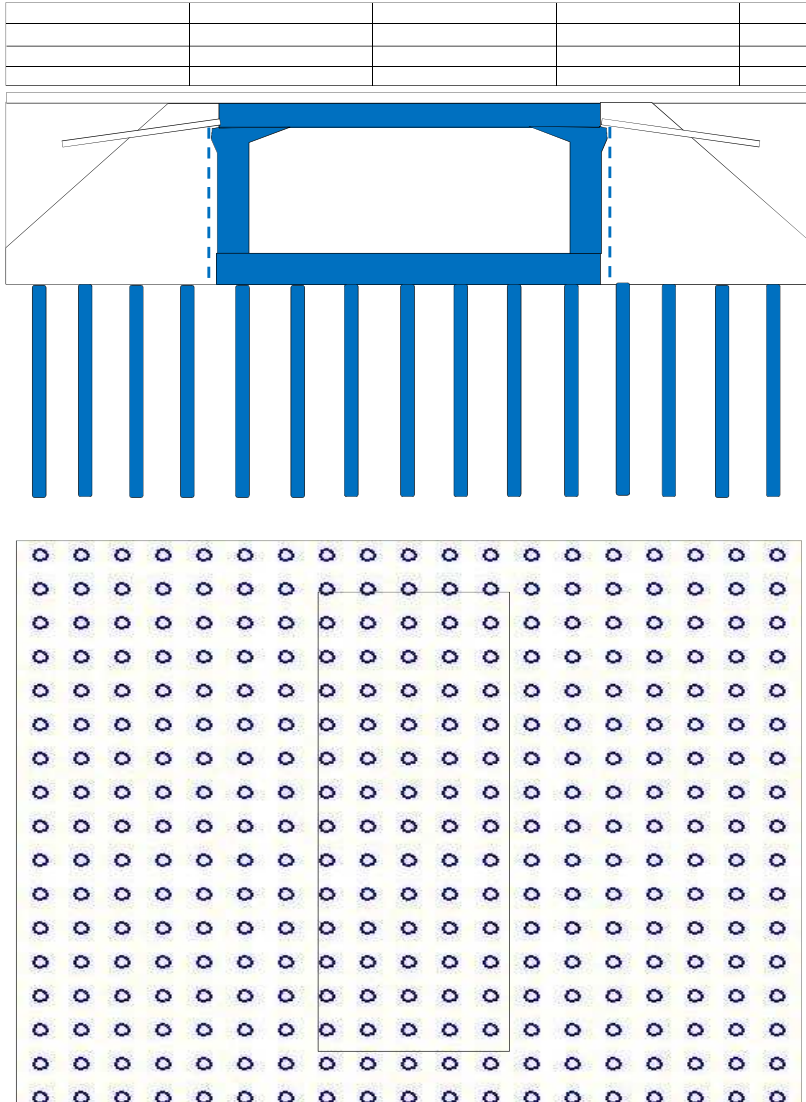

**Obiekt 02-PZ km 449+615,4**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



- izolacja zgrzewalna - 10%
- beton ochronny izolacji - 100%
- zasypka inżynierska - 100%
- płyta przejściowa - 100%

**Obiekt 03PZ i 04PG**

Stan na 31.05.2016 r.


Załącznik nr 22

**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku


**Obiekt 03PZ km 450+553,76**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

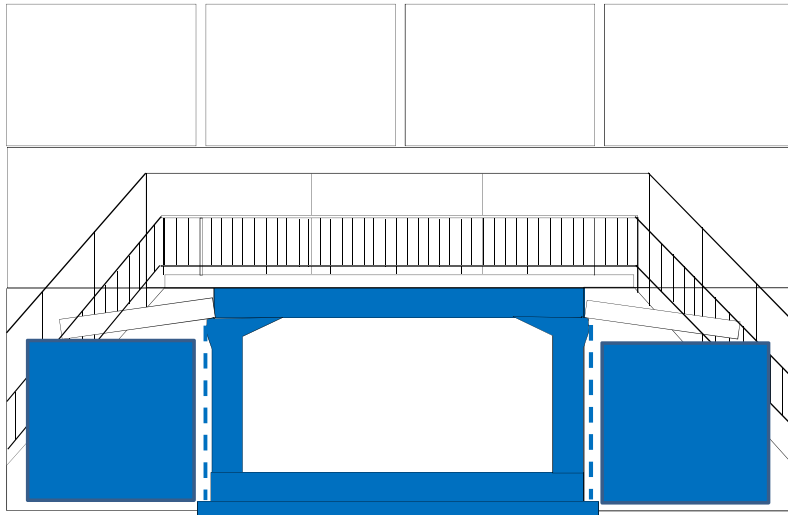

**Obiekt 04PG km 450+568,93**

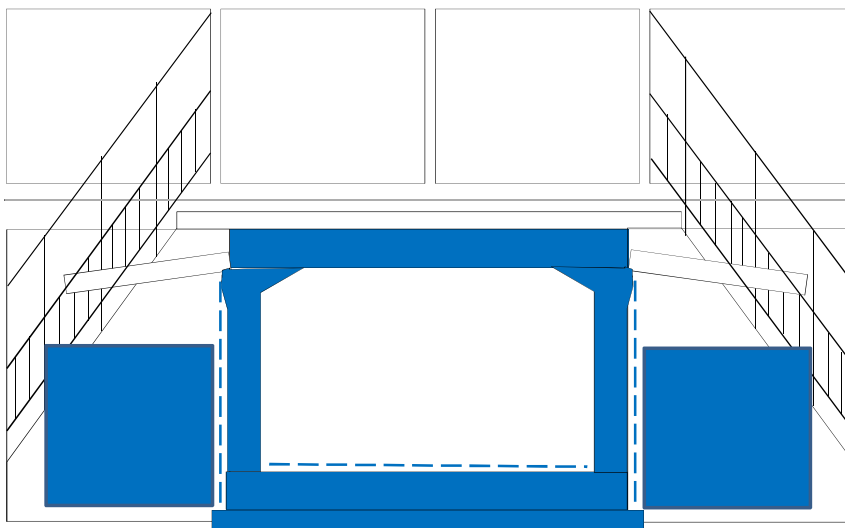


Wykonano w okresie sprawozdawczym:



**Obiekt 05WD**  
Stan na 31.05.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 05-WD km 451+025.03**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż desek gzysmowych - 50%
- montaż krawężników - 50%
- zbrojenie kap chodnikowych - 30%






**Obiekt 06PZ i 06APZ**


Stan na 31.05.2016 r.

Załącznik nr 22

**LEGENDA**


-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 06PZ km 451+372.9**




Wykonano w okresie sprawozdawczym:

kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych




**Obiekt 06APZ km 0+371.86**

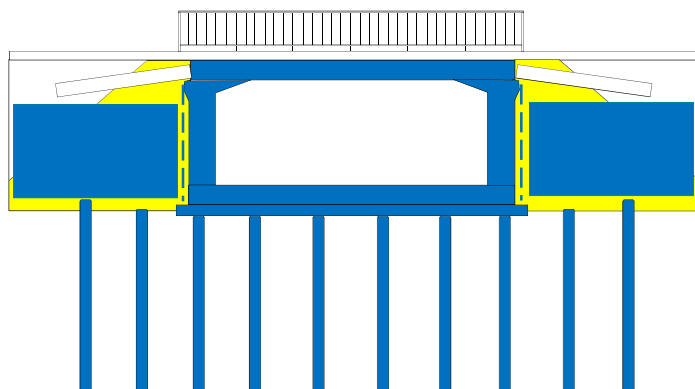

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie i deskowanie skrzydełek - 100%
- betonowanie skrzydełek - 75%

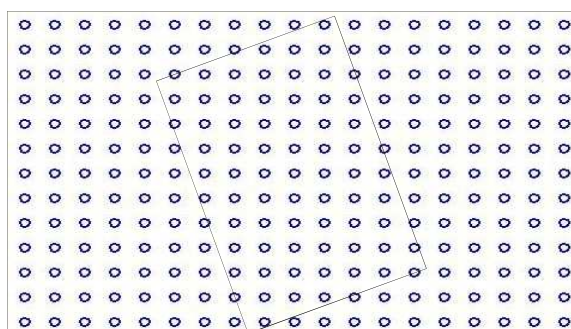


kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych



**Obiekt 7APZ i 7PZ**  
Stan na 31.05.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 7APZ km 0+499,29**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- zbrojenie i deskowanie ramy - 100%
- betonowanie ramy - 100%
- izolacja cienka - 90%



**Obiekt 7PZ km 451+514,9**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- zbrojenie i deskowanie ramy - 25%
- betonowanie ramy - 50%
- izolacja cienka - 90%
- zasyпки tymczasowe - 50%



**Obiekt 08WG**

Stan na 31.05.2016 r.


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 08-WG km 452+388.57**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż płyt gzymsowych - 80%
- ustawianie krawężników - 80%
- zbrojenie kap chodnikowych - 80%
- betonowanie kap chodnikowych - 80%






**Obiekt 09PZ i 10PZ**

Stan na 31.05.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 09-PZ km 452+689**


Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- nasyp przeciążeniowy - 100%

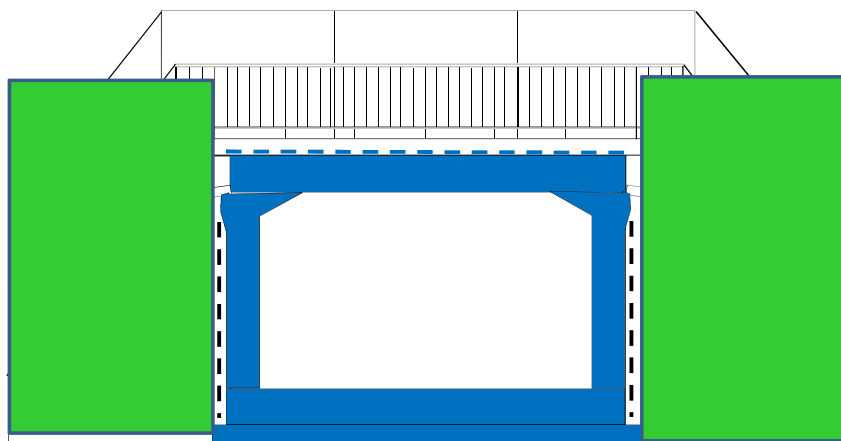

**Obiekt 10PZ km 452+978,13**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

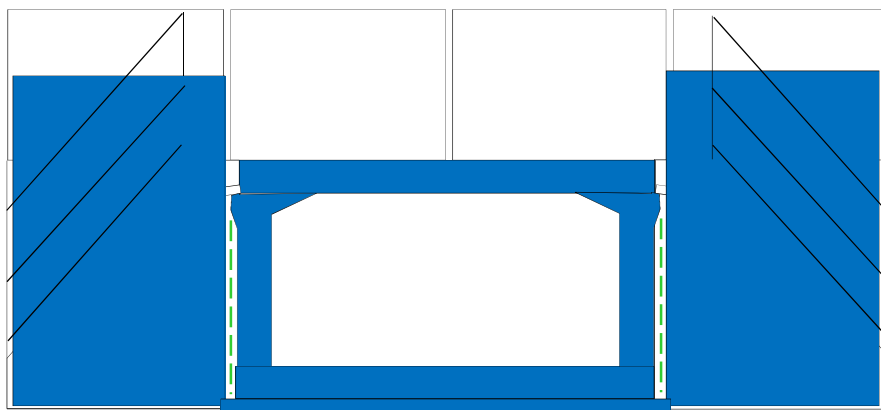

**Obiekt 11PZ i 12PG**

Stan na 31.05.2016 r.


Załącznik nr 22

**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

**Obiekt 11-PZ km 454+262**


Wykonano w okresie sprawozdawczym:

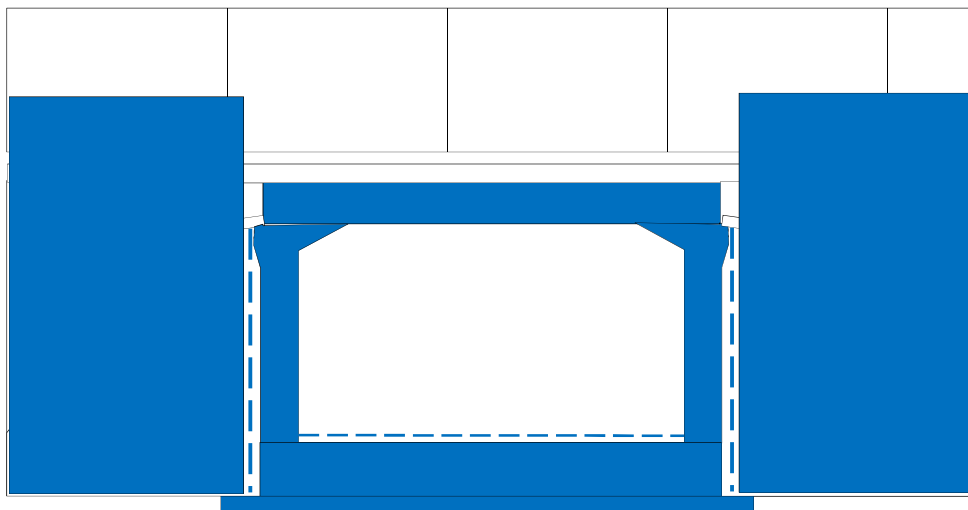

**Obiekt 12-PG km 454+415,34**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- nasyp przeciążeniowy - 100%





**Obiekt 13WG i 14WD**

Stan na 31.05.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

**Obiekt 13-WG km 455+351.4**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- montaż płyt gzymsowych - 80%
- ustawianie krawężników - 80%
- montaż zbrojenia kap chodnikowych - 10%

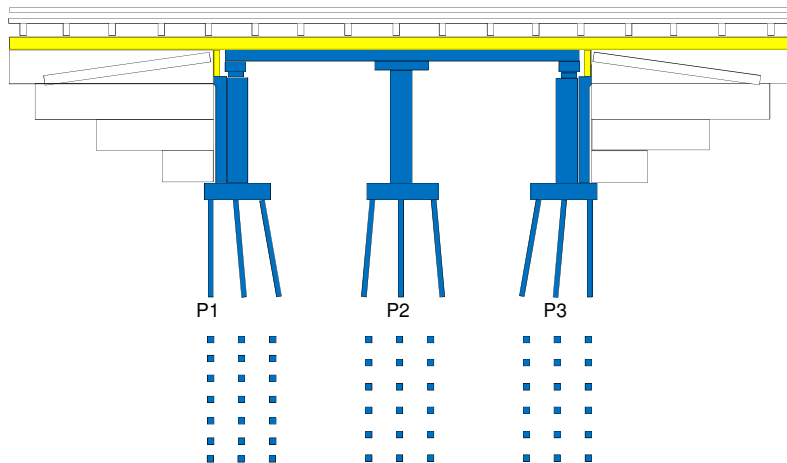

**Obiekt 14 WD km 455+815**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zasypka inżynierska - 30%
- podłoże pod platformy rusztowań dla ustroju nośnego - 60%






Uwaga: na widoku z góry pokazano wykonanie poszczególnych pali, natomiast na widoku z boku zaawansowanie prac w poszczególnym rzędzie. Do momentu wykonania wszystkich pali w danym rzędzie uznaje się, że są to roboty w toku.

**Obiekt 15 PZ**

Stan na 31.05.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 15PZ km 457+204**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton ochronny na izolacji zgrzewalnej - 100%
- zasypka inżynierska -100%
- beton wyrównawczy pod płyty przejściowe - 100%






**Obiekt 16A PZ i 16PZ**

Załącznik nr 22


Stan na 31.05.2016 r.

**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 16APZ km 458+065,23**


Wykonano w okresie sprawozdawczym:

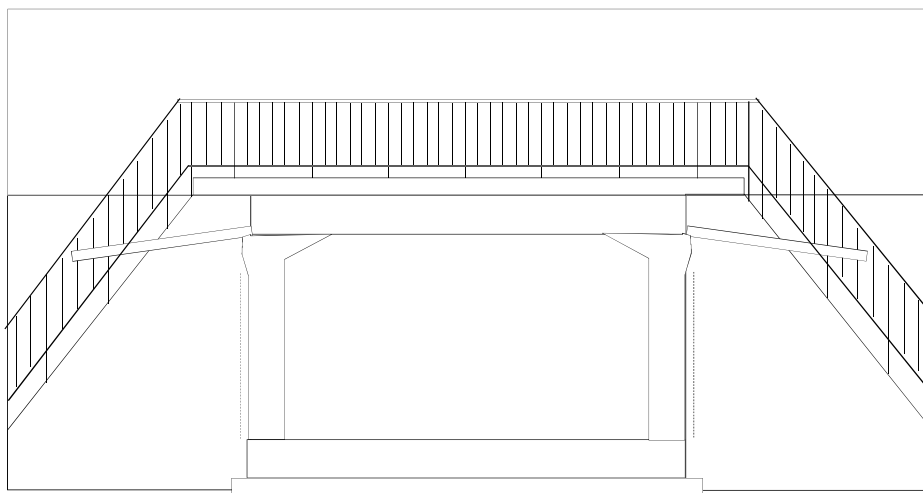

**Obiekt 16-PZ km 458+361**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie i deskowanie konstrukcji ramy - 20%
- betonowanie konstrukcji ramy - 100%
- beton wyrównawczy pod skrzydełka - 100%
- zbrojenie skrzydełek - 70%

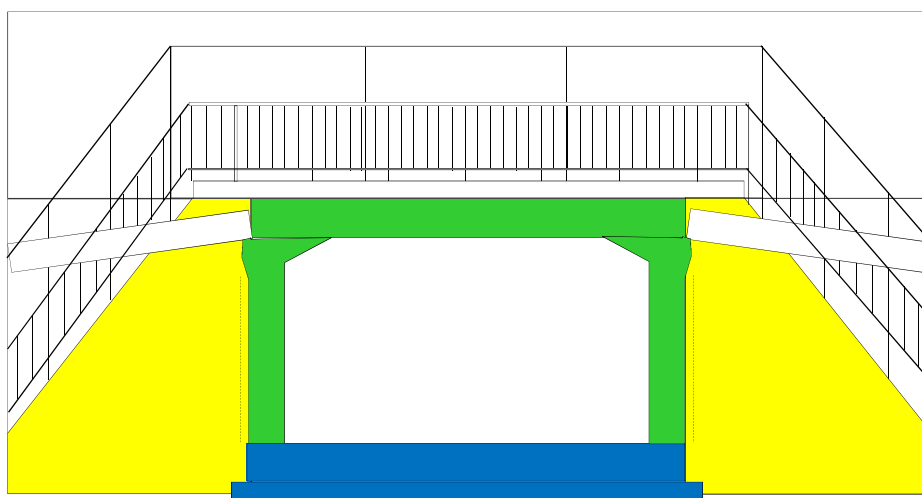

**Obiekt 17WE**

Stan na 31.05.2016 r.

Załącznik nr 22

**LEGENDA**


	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 17WE km 458+584**

**Obiekt 17CWE**

**Obiekt 17AWE**

**Obiekt 17BWE**



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie konstrukcji - 10%
- betonowanie konstrukcji ramy - 25%
- deskowanie konstrukcji ramy - 20%
- izolacja cienka - 10%
- zbrojenie i deskowanie rozpór - 100%
- betonowanie rozpór - 100%

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- izolacja cienka - 10%
- wykonanie rusztowania pod belki - 50%
- montaż belek - 50%
- montaż deskowania pod ustrój nośny - 5%

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- betonowanie trzonów przyczółków P1 i P2 - 10%
- betonowanie i zbrojenie ciosów - 70%
- montaż łożysk - 100%
- zbrojenie i deskowanie rozpór - 100%
- betonowanie rozpór - 100%

**Obiekt 18APZ i 18PZ**

Stan na 31.05.2016 r.


Załącznik nr 22

**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 18APZ km 458+452,51**


Wykonano w okresie sprawozdawczym:

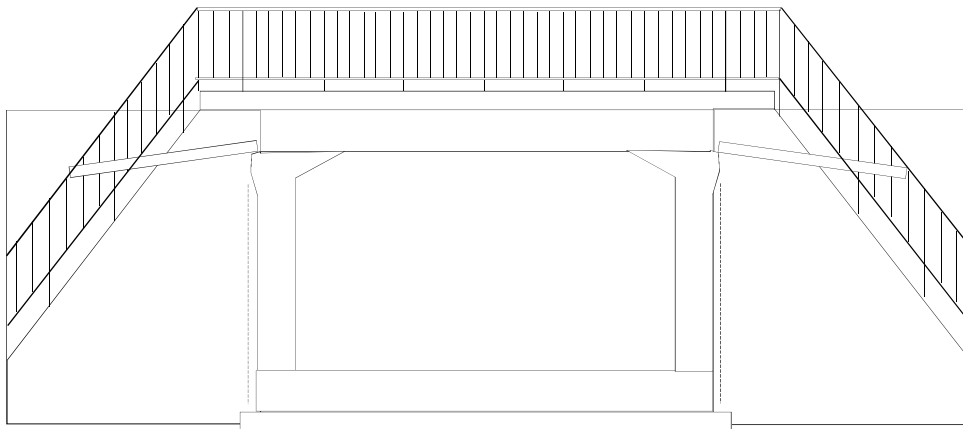

**Obiekt 18PZ km 458+745**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zasypka inżynierska - 20%

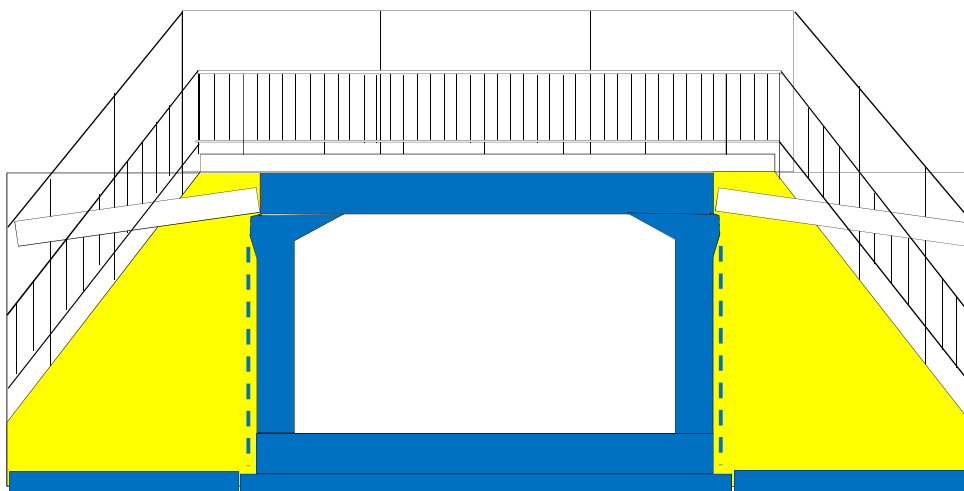




**Obiekt 19PZ i 20 PZ**

Stan na 31.05.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 19-PZ km 459+806,12**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- zbrojenie i deskowanie konstrukcji ramy - 50%
- beton konstrukcji ramy - 50%



**Obiekt 20-PZ km 459+894**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton ochronny na izolacji grzewalnej - 100%
- zasyпка inżynierska - 10%

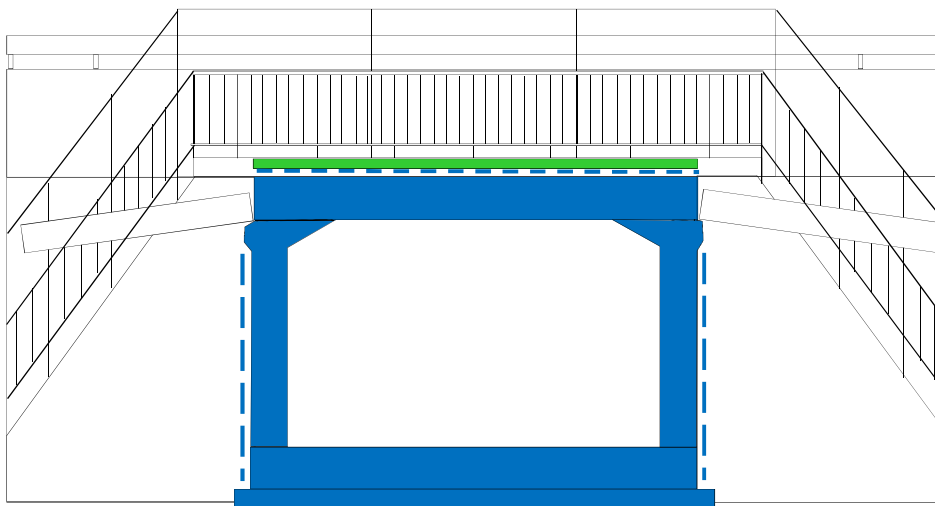




**Obiekt 21 PZ i 22WD**

Stan na 31.05.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 21-PZ km 460+360,51**


Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton wyrównawczy pod skrzydełka - 100%
- zbrojenie i deskowanie skrzydełek - 100%
- beton ław i ścian skrzydełek - 100%
- izolacja cienka - 10%



**Obiekt 22-WD km 460+446**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

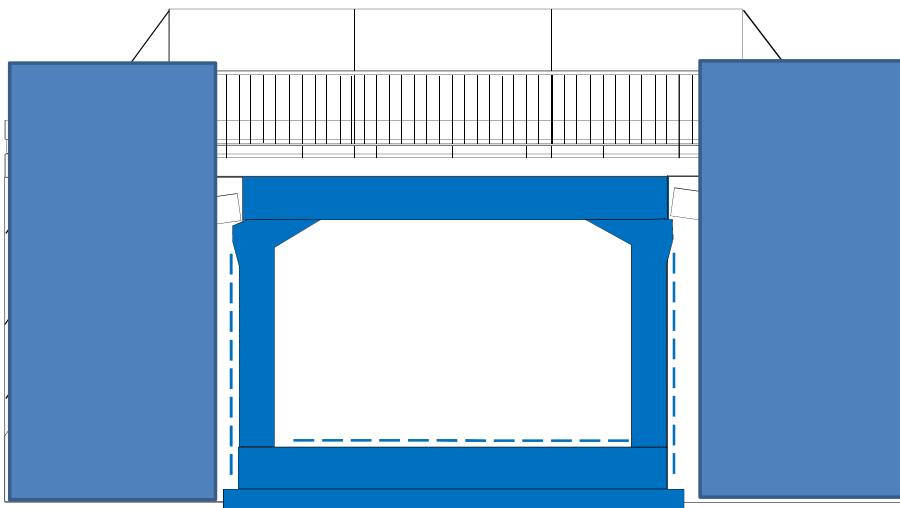




**Obiekt 23 PZ i 24PZ**

Stan na 31.05.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 23-PZ km 460+545,02**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- beton ochronny na izolacji zgrzewalnej - 90%
- izolacja zgrzewalna - 45%
- izolacja cienka - 45%
- zbrojenie i deskowanie skrzydełek - 10%
- beton skrzydełek - 50%

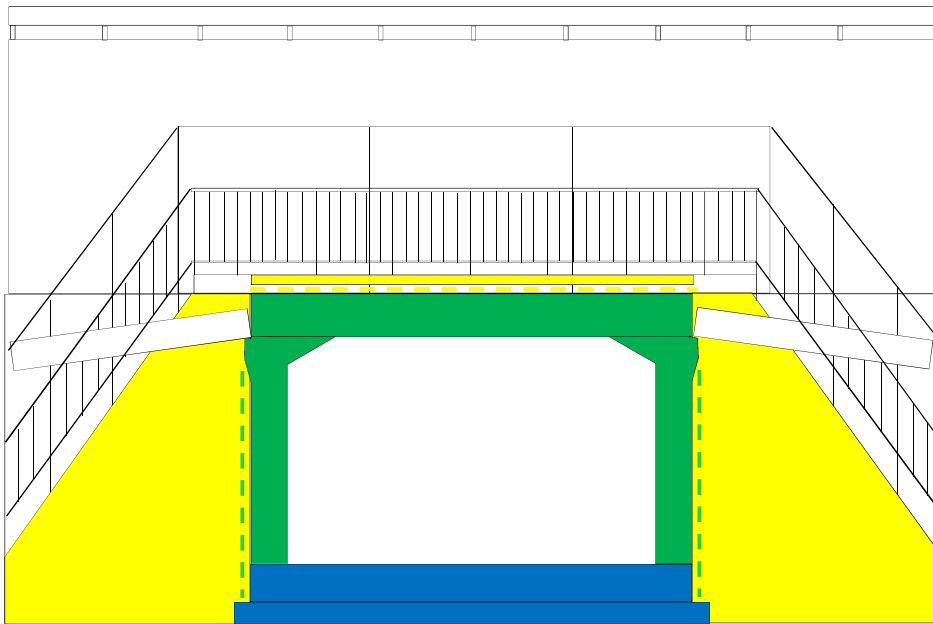

**Obiekt 24-PZ km 461+217  
ETAP 1**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie i deskowanie skrzydełek - 20% etap 1
- beton konstrukcji skrzydełek - 70% etap1
- beton ochronny na izolacji zgrzewalnej - 90% etap1
- zasypki inżynierskie - 30%

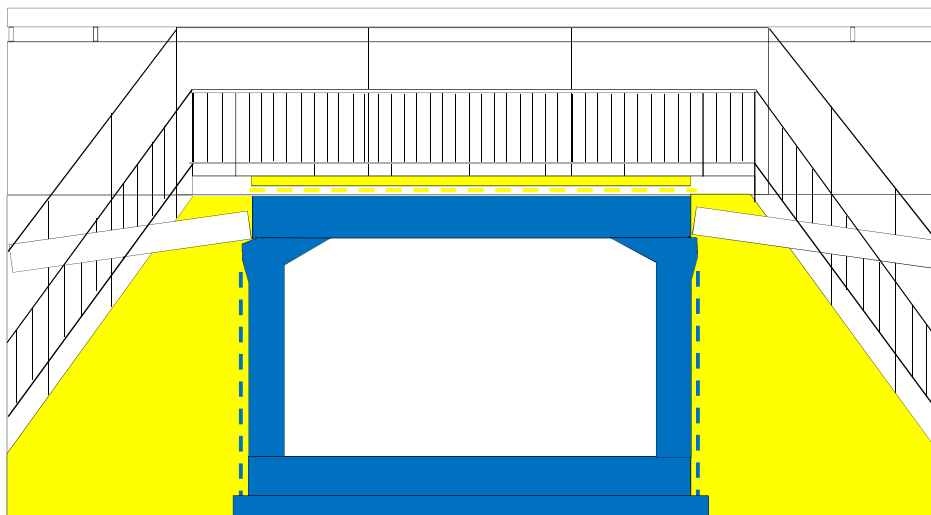






**Obiekt 25PZ**

Stan na 31.05.2016 r.

Załącznik nr 22

**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 25 PZ km 461+124 istniejący**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- warstwa ochronna na izolacji grzewalnej - 90%
- zasypka inżynierska - 100%

